Ministero della Giustizia

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

MECCANISMO DI VALUTAZIONE

RULE OF LAW 2023

Digitalizzazione del processo civile riformato Cartabia



Roma/Bruxelles, 20 marzo 2023

Indice

1. Riforma Cartabia: approccio progettuale
Processo civile presso gli Uffici di merito

2. Riforma Cartabia: approccio progettuale
Processo civile presso la Corte di Cassazione

3. Riforma Cartabia: Stato dei Lavori
Rilasci software sul PCT presso gli Uffici di merito

4. Riforma Cartabia: rilasci software al 28/02 e release successive - Focus PCT Uffici di merito

1. Riforma Cartabia: approccio progettuale
Processo civile presso gli Uffici di merito

La riforma Cartabia del processo civile ha un **impatto profondo sui sistemi informativi del Ministero della Giustizia**, da gestire in concomitanza con l'avvio della reingegnerizzazione dei sistemi del processo civile telematico (PCT), già in esercizio dal 2005 su sistema legacy.

Impatto Riforma Cartabia	*Approccio progettuale adottato*
Riforma ampia e pervasiva (rito ordinario civile, Giudici di Pace, Tribunale della Famiglia, etc.)	Istituzione di un ''**Gruppo di Lavoro Cartabia**'' interdisciplinare (utenti, referenti di Progetto e Fornitore) che si incontra settimanalmente per il chiarimento tempestivo delle norme impattanti le gestioni informatiche e per la verifica ed approvazione dei requisiti utente.
Applicabilità ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 28.02.2023	Mantenimento dei flussi relativi ad entrambi i riti ed attività ICT di gestione sistemistica.
Adozione incrementale dei precetti della Riforma Cartabia (01.01.2023, 28.02.2023, 30.06.2023.)	Progettazione e realizzazione del software in fasi realizzative incrementali: • 28/02/2023: evoluzione attuale PCT per rito ordinario Cartabia (elementi essenziali) e adeguamento del registro informatico presso il Tribunale per i Minori • 30/06/2023: adeguamento alla riforma di tutte le fasi del rito ordinario ed estensione del PCT al Tribunale per i Minorenni, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, al Commissario per la liquidazione degli usi civici.


2. Riforma Cartabia: approccio progettuale
Processo civile presso la Corte di Cassazione

Il Rito Cartabia ha un **impatto significativo sull'organizzazione della Corte di Cassazione, con la conseguente profonda revisione dei sistemi informatici realizzati per il processo civile telematico (PCT) di legittimità**. L'approccio progettuale è stato improntato alla **modalità agile,** per **adattare in modo incrementale gli strumenti informatici** al processo di **riorganizzazione di uffici e competenze.**

Impatto Riforma Cartabia	*Approccio progettuale adottato*
Soppressione della Sesta sezione Civile	Istituzione nel mese di ottobre 2022 di un ''**Gruppo di Lavoro**'' (referenti CED Cassazione, referenti DGSIA e Fornitore) che si incontra settimanalmente per l'analisi delle modifiche organizzative impattanti le gestioni informatiche e per la definizione delle specifiche tecniche. Le modifiche ai sistemi informatici relative alla soppressione della Sesta sezione civile sono entrate **in esercizio il 3/01/2023**.
Introduzione del rito di definizione anticipata (in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza)	Progettazione di un modello organizzativo flessibile in grado di adattarsi ai diversi flussi di lavoro adottati dalle sezioni ordinarie. Le modifiche ai sistemi informatici sono entrate **in esercizio il 9/01/2023**. Ulteriori evoluzioni sono in corso di realizzazione.
Introduzione dell'istituto del rinvio pregiudiziale	Progettazione di un modello organizzativo nuovo e specifico. Il Primo Presidente, in data 8/02/2023, ha disposto la costituzione di un Ufficio per le Questioni Pregiudiziali. Le modifiche ai sistemi informativi sono in via di realizzazione. Il rilascio è previsto entro il mese di **aprile 2023**.
Acquisizione d'ufficio del fascicolo del grado precedente.	È stata realizzata una cooperazione applicativa fra i sistemi informatici degli Uffici di merito e di Cassazione. L'acquisizione si realizza mediante l'apertura di visibilità, a favore della Suprema Corte, del fascicolo informatico presso l'Ufficio di merito. La modifica evolutiva è passata **in esercizio il 27/02/2023**.

3. Riforma Cartabia: stato dei Lavori
Rilasci software sul PCT presso gli Uffici di merito

Le **attività sono state avviate prontamente** al fine di poter rispettare le **milestone di rilascio** previste dalla Riforma

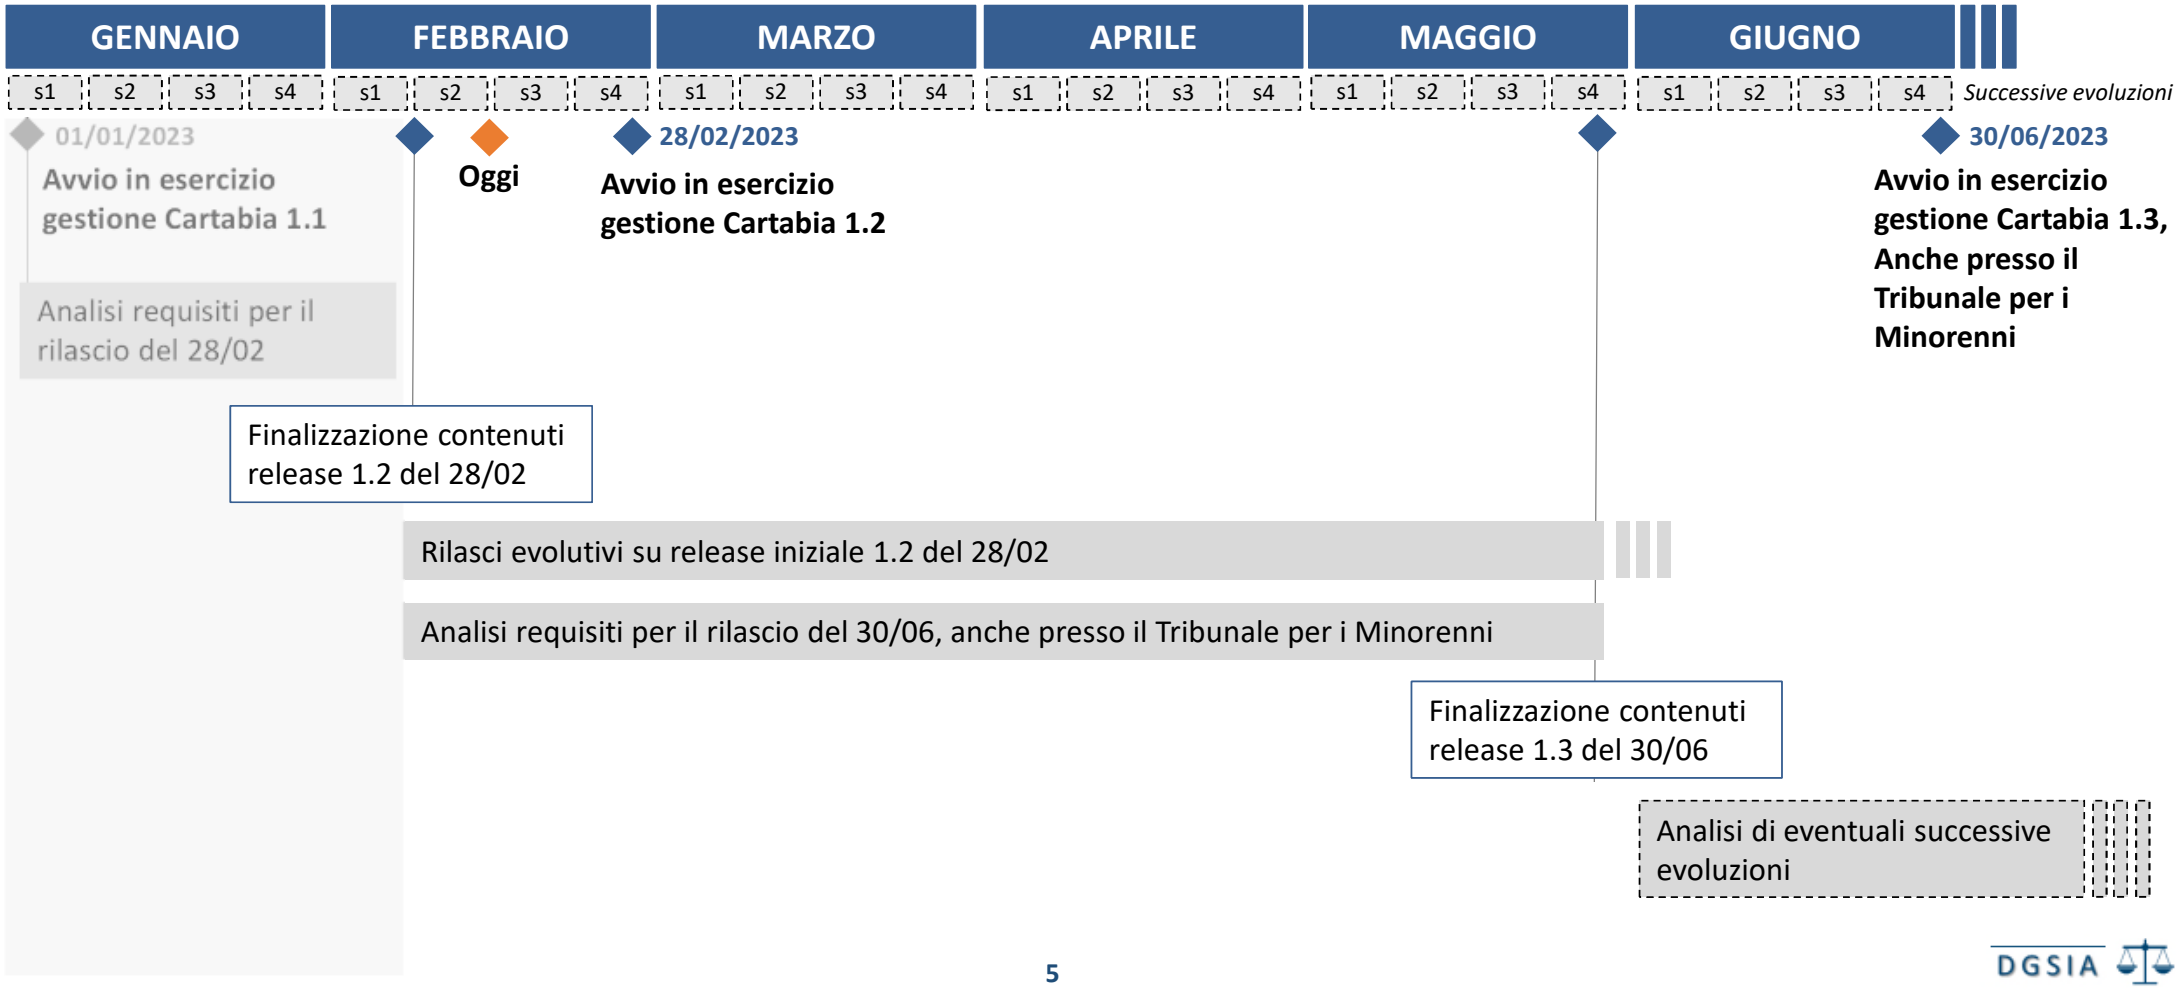

DGSIA

4. Riforma Cartabia: rilasci software al 28/02 e release successive
Focus PCT Uffici di merito

La **prima release del 28/02 supporterà gli interventi abilitanti l'avvio della Riforma**, come discussi e concordati nel Gruppo di Lavoro Cartabia, **demandando le evoluzioni ed i miglioramenti a release successive**

Interventi evolutivi ICT Riforma Cartabia	Approccio realizzativo release 1.2 del 28/02	Dettaglio rilasci evolutivi release 1.2 del 28/02	Dettaglio rilasci evolutivi successivi (dopo il 28/02)
Rito ordinario Cartabia – I grado	Flussi macchina stati eventi dedicati	• Fase introduttiva con verifiche preliminari fino a prima udienza di trattazione • Scadenziario e cartelle di monitoraggio dei procedimenti	Fase istruttoria e decisoria
Rito ordinario Cartabia – II grado	Clonazione del previgente flusso di rito ordinario di Corte d'Appello, con adattamento	Rilascio funzionalità completa	Successive revisioni del flusso
Rito ordinario Cartabia – Giudici di Pace	Adattamento delle fasi iniziali del procedimento	Rilascio funzionalità completa	Evoluzioni
Procedure esecutive (mobiliari e immobiliari)	Adattamento delle fasi inziali del procedimento	• Nuova nota di pignoramento • Gestione vendita diretta	Evoluzioni
Procedimenti in materia di stato delle persone e famiglia – Tribunale per i Minorenni	Clonazione dei flussi e degli oggetti previgenti, con adattamento	Nell'immediato, solo interventi su SICID e SIGMA civile (Minorenni) esistenti. Entro il 30 giugno 2023, PCT Minorenni in SICID. Successivamente, reingegnerizzazione per gestione presso il nuovo Tribunale della Famiglia	Evoluzioni
Nuovo rito semplificato	Primo step: clonazione del flusso del previgente art. 702 bis c.p.c., con adattamento		Evoluzioni
